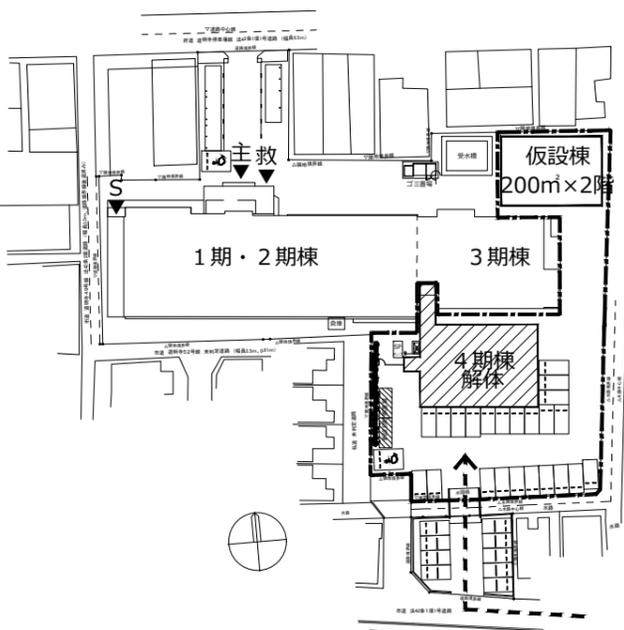
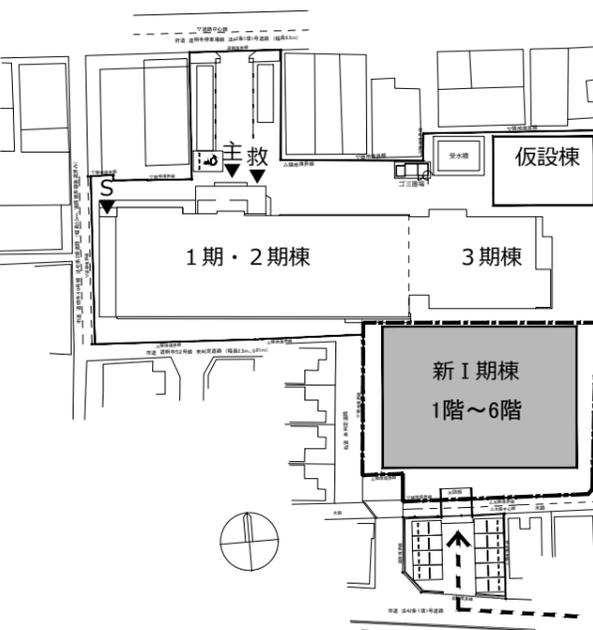
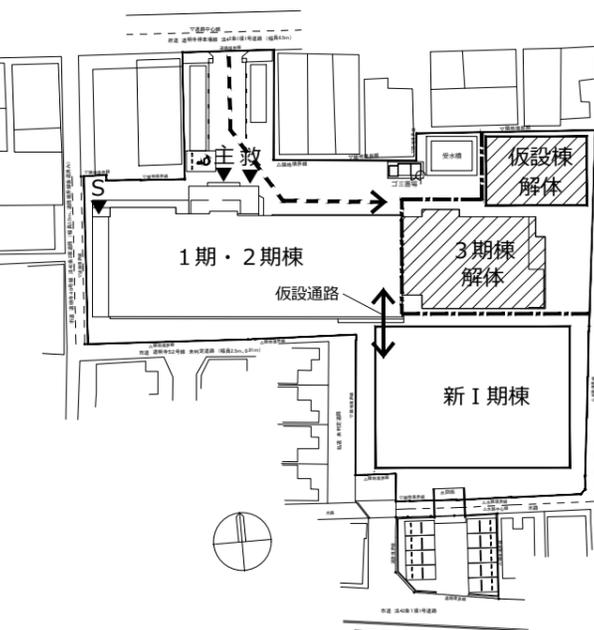
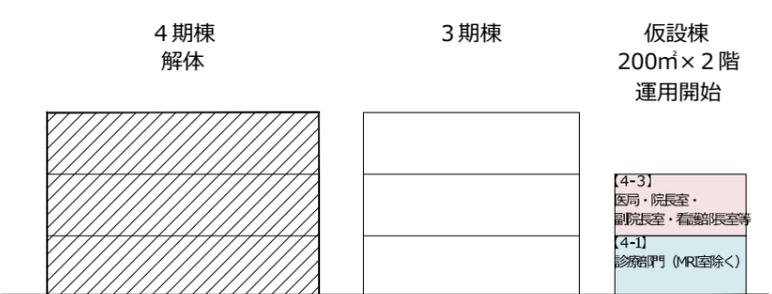
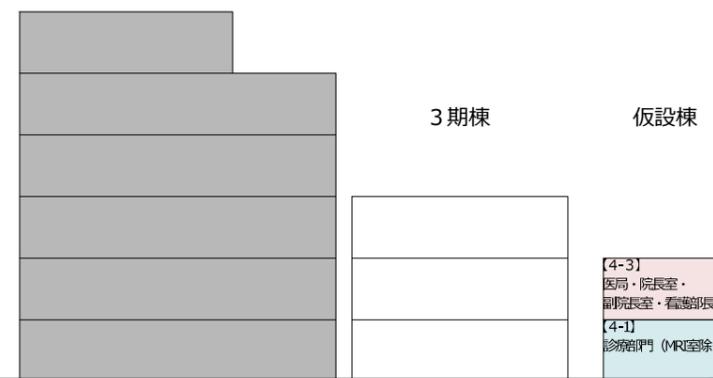
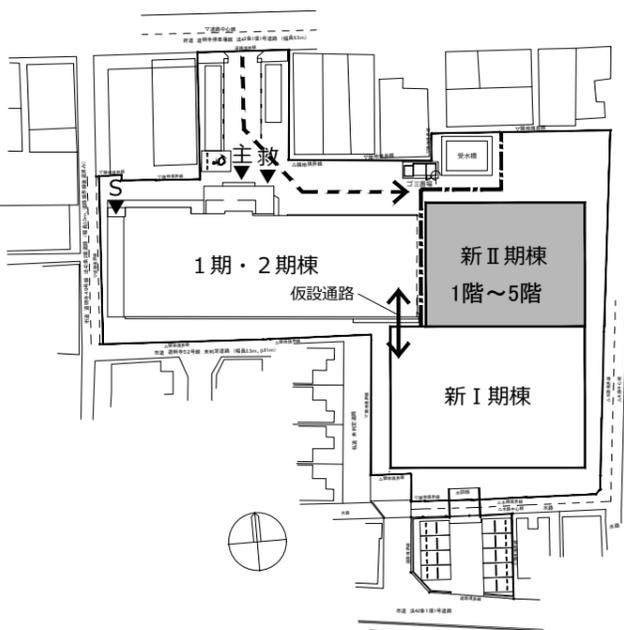
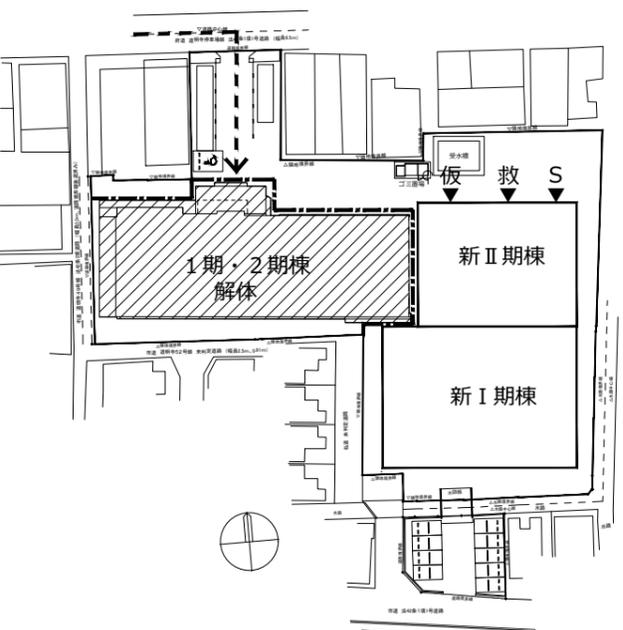
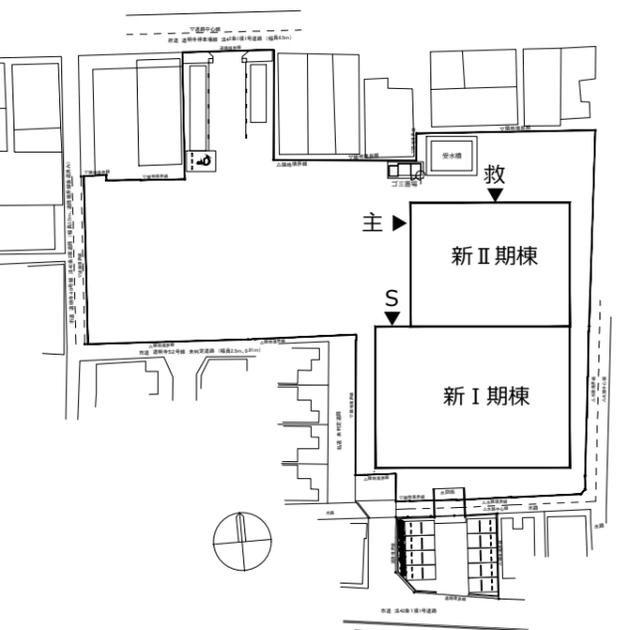
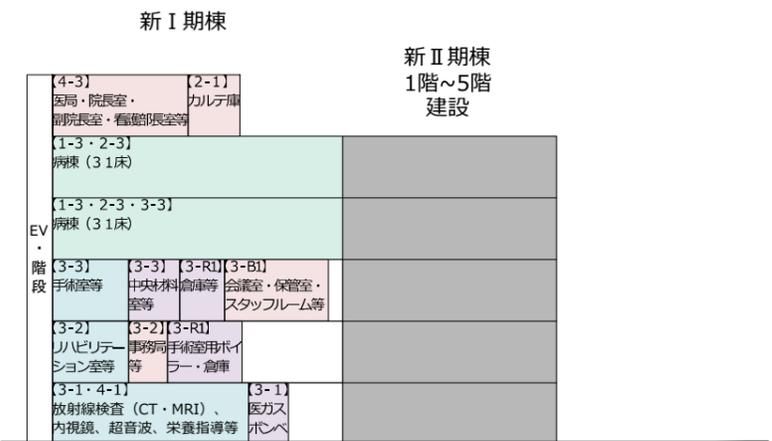
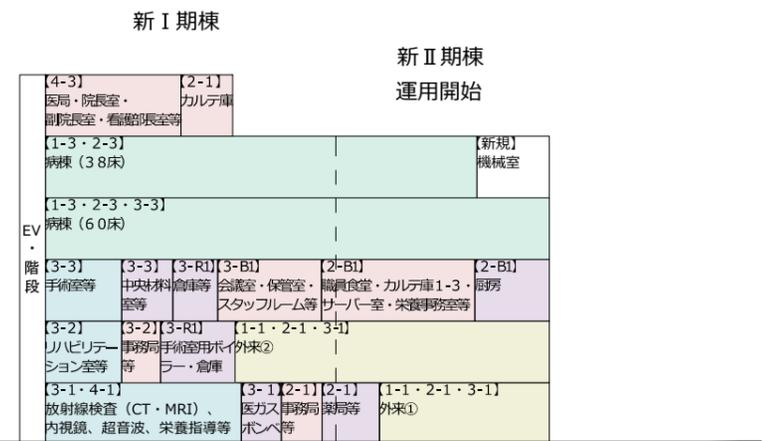
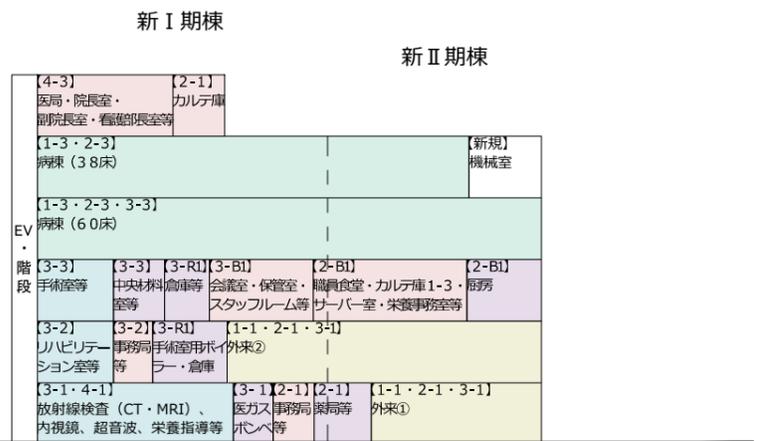


1. 準備工事	2. I期工事	3. I期解体工事
<p>平面構成</p> 	<p>平面構成</p> 	<p>平面構成</p> 
<p>断面構成</p> 	<p>断面構成</p> 	<p>断面構成</p> 
<p>【建設】 仮設棟、SPポンプ（場所未定）、消火水槽（場所未定）                  【引越】 4期棟管理部門（医局、院長室、副院長室、看護部長室、図書室、会議室、等）                  4期棟診療部門（X線テレビ室、内視鏡室、超音波室、栄養指導室、総合健診診察室）                  【解体】 4期棟、SPポンプ、駐車場、南側駐輪場、等</p>	<p>【建設】 新I期棟                  【引越】 -                  【解体】 -</p>	<p>【建設】 -                  【引越】 3期棟、仮設棟、病床60床（休床20床含む）                  【解体】 3期棟、仮設棟</p>
<p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※4期棟解体前に仮設棟の建設が必要</li> <li>※既存棟から仮設棟への患者動線が外部を経由する</li> <li>※病床20床は休床（特浴室使用不可）</li> <li>※MRI検査の中止が必要</li> <li>※4期棟管理部門の仮設棟入居時、現状より若干手狭になる可能性あり</li> <li>※一般車両・救急車両・サービス車両の動線整理                      （サービス車両は西側2項道路から進入と想定）</li> <li>※駐車場（43台分）の代替確保（南敷地駐車場は封鎖と想定）</li> </ul>	<p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※既存棟から仮設棟への患者動線が外部を経由する</li> <li>※病床20床は休床（特浴室使用不可）</li> <li>※MRI検査の中止が必要</li> <li>※一般車両・救急車両・サービス車両の動線整理</li> </ul>	<p>課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※工事車両経路が北側道路からに変更</li> <li>※工事車両経路と一般車両・救急車両の動線が重なる</li> <li>※消防活動空地の確保</li> <li>※1期・2期棟と新I期棟をつなぐ仮設通路が必要（臨床検査室の一部を経由）</li> </ul>

凡例	 工事範囲  工事車両経路	 主玄関  サービス  救急  仮玄関	 病棟部門  外来部門  診療部門  管理部門  供給部門	例) 【4-3】: 既存4期棟3階の諸室
----	---	--	--	----------------------

4. II期工事	5. II期解体工事	6. 外構工事
<p>平面構成</p> 	<p>平面構成</p> 	<p>平面構成</p> 
<p>断面構成</p> 	<p>断面構成</p> 	<p>断面構成</p> 
<p>【建設】新II期棟</p> <p>【引越】-</p> <p>【解体】-</p>	<p>【建設】-</p> <p>【引越】1期・2期棟各部門</p> <p>【解体】1期・2期棟</p>	<p>【建設】外構、駐車場等</p> <p>【引越】-</p> <p>【解体】-</p>
<p>課題 ※工事車両経路と一般車両・救急車両の動線が重なる</p> <p>※消防活動空地</p>	<p>課題 ※工事車両経路と一般車両・救急車両の動線が重なる</p> <p>※消防活動空地</p>	<p>課題 ※工事車両経路と一般車両・救急車両の動線が重なる</p> <p>※北側駐輪場等を建て替える場合、工事を行うタイミング</p>

凡例	 工事範囲  工事車両経路	 主玄関  サービス  救急  仮玄関	 病棟部門  外来部門  診療部門  管理部門  供給部門	例) 【4-3】: 既存4期棟3階の諸室
----	---	--	--	----------------------
